

T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ



2022 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU



1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Galatasaray Üniversitesi, Atatürk ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amacına erişmek için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmek üzere hazırlanan Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

2. GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon

“Toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası iş birliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektedir.”

2. Vizyon

“Bilime katkıları ve eğitimde iş birlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.”

3. Temel Değerler

- Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
- Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı
- Öğrenci ve çalışan odaklılık
- Uluslararası iş birliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler
- Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı
- Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık
- Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Toplumsal ve çevresel duyarlılık

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
<u>Stratejik Amaç 1:</u> Üniversitenin nitelikli öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilirliğinin artırılması	<u>Hedef 1.1:</u> Kabul edilen öğrenci niteliğinin artırılması <u>Hedef 1.2:</u> Öğrenci bağlılığının artırılması <u>Hedef 1.3:</u> Mezunlarla iş birliğinin artırılması
<u>Stratejik Amaç 2:</u> Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması	<u>Hedef 2.1:</u> Eğitim programlarının geliştirilmesi <u>Hedef 2.2:</u> Akademik personelin üst düzey yetkinliğinin korunması
<u>Stratejik Amaç 3:</u> Bilimsel araştırmaların niteliğinin, çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	<u>Hedef 3.1:</u> Bilimsel araştırma çıktılarının niteliğinin artırılması <u>Hedef 3.2:</u> Disiplinler arası çalışmaların artırılması

	<u>Hedef 3.3:</u> Bilimsel arařtırmaların yaygınlařtırılması
<u>Stratejik Amaç 4:</u> Bilimsel arařtırma sayısının artırılması	<u>Hedef 4.1:</u> Bilimsel arařtırma projelerine katılımın artırılması <u>Hedef 4.2:</u> Arařtırma bütçe ve imkanlarının çeřitlendirilmesi
<u>Stratejik Amaç 5:</u> Kurumsallařma faaliyetlerinin pekiřtirilmesi	<u>Hedef 5.1:</u> Kalite güvence sisteminin kurulması ve yaygınlařtırılması <u>Hedef 5.2:</u> Teknoloji altyapısının güçlendirilmesi
<u>Stratejik Amaç 6:</u> Kurum ii ve dıřı paydařlarla olan iletiřim ve iř birlięi faaliyetlerinin artırılması	<u>Hedef 6.1:</u> Kurum ii birimlerde iletiřim ve iř birlięinin artırılması <u>Hedef 6.2:</u> Dıř paydařlarla olan iletiřim ve iř birlięinin artırılması
<u>Stratejik Amaç 7:</u> Toplumsal geliřime katkıda bulunan alıřmaların artırılması	<u>Hedef 7.1:</u> Toplumsal geliřime katkı alıřmalarının yaygınlařtırılması <u>Hedef 7.2:</u> Toplumsal ve evresel duyarlılık projelerinin artırılması

4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
 - a) Hazine Yardımı
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri (Lojman, kantin vb.)
 - 2) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 3) Örgün Öğretim Gelirleri
 - 4) Öğrenci Telafi Giderleri
 - 5) Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
 - 6) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) AB
 - c) Erasmus
 - d) Sentez Projeleri
 - e) Mevlâna

5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI:

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38'inci maddesinde "Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55' inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekler..", 46'ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına


tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 27’nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 43’üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, sayılabilir.

6. ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI 06 SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODU ALTINDA YER ALAN ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI

2022 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI						
	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Harcama Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
06. SERMAYE GİDERLERİ	31.452.000,00	11.694.545,00	0,00	43.146.545,00	41.861.907,91	97
06.1 Mamul Mal Alımı	2.950.000,00	550.000,00	0,00	3.500.000,00	3.487.225,36	100
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.358.792,76	70
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.702.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00	2.678.340,40	99
06.6 Menkul Malların Büyük Onarımı	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	542.800,00	99
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	23.300.000,00	11.144.545,00	0,00	34.444.545,00	33.794.749,48	98

2022 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımı ve Gerçekleşme Tablosu


■ Toplam Ödenek ■ Gerçekleşen Harcama

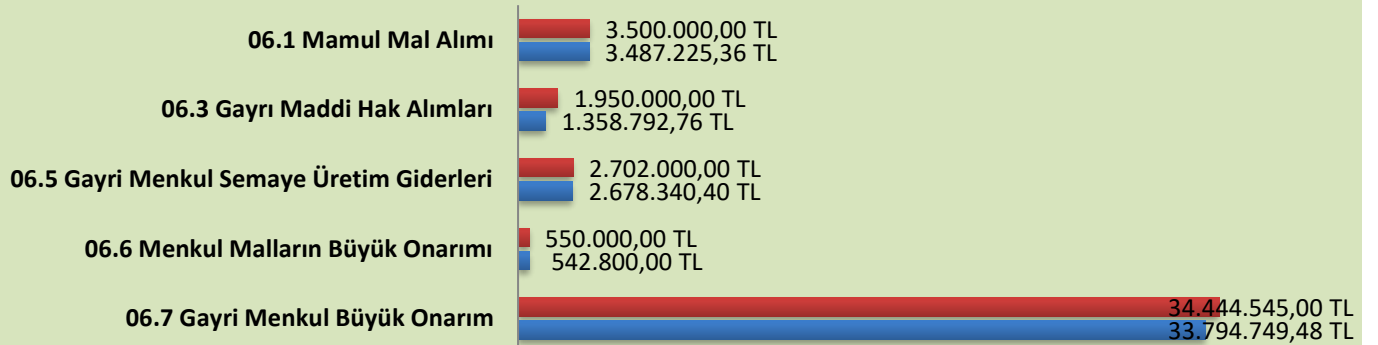

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2022 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİNİ GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI					
	Kurum Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Kesin Harcama	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
01 -Personel Gideri	98.106.000,00	147.550.154,00	131.764.316,68	12.431.837,32	89
02-Sos.Güv.Kur.D. Prim Giderleri	14.387.000,00	21.233.735,00	19.473.267,02	1.290.467,98	92
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.178.000,00	36.025.010,00	34.342.479,44	502.830,56	95
05 -Cari Transferler	5.286.000,00	12.090.345,00	12.025.144,66	65.200,34	99
06 -Sermaye Giderleri	31.452.000	43.146.545,00	41.861.907,91	1.284.637,09	97
Toplam	163.409.000,00	260.045.789,00	239.467.155,71	15.574.973.29	92

KURUM TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİNİN BÜTÇE GİDER KALEMLERİNE DAĞILIM YÜZDESİ

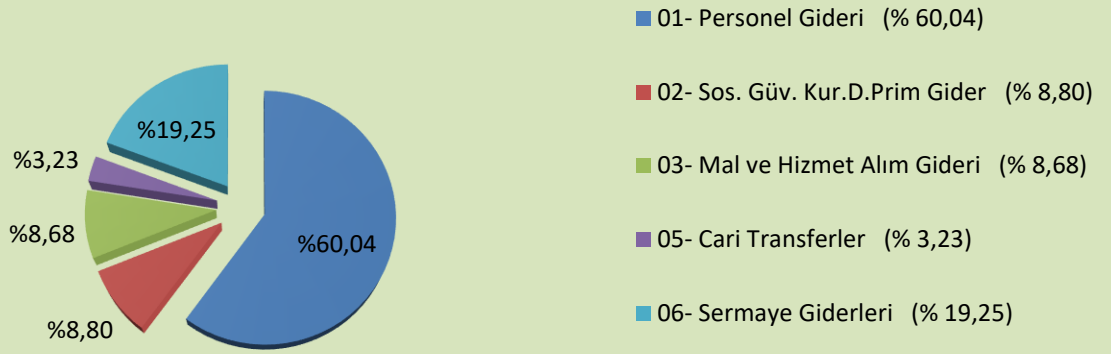

7. KURULUŞUN MEVCUT FİZİKSEL YAPISI

Galatasaray Üniversitesi, kurulduğu günden beri Ortaköy’de bulunan yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Üniversite’nin Sahil Yerleşkesinde (Ortaköy Yerleşkesi deniz tarafı) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yabancı Diller Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Genel Sekreterlik, çeşitli daire başkanlıkları ve idari bürolar ile yemekhane ve kantin bulunmakta, Yıldız Yerleşkesinde ise (Ortaköy Yerleşkesi kara tarafı) derslikler, laboratuvarlar, stüdyolar, çok amaçlı salonlar, Suna Kıraç Kütüphanesi ile öğrenci yemekhanesi, kantin ve fotokopi merkezi hizmet vermektedir.

Galatasaray Üniversitesinin bulunduğu kampüs alanlarına yeni tesisler yapılmasına, bulunulan bölgenin özelliği itibarıyla imkân bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut tesislerin daha ekonomik ve rasyonel olarak kullanılması söz konusudur.

Özellikle tarihi binalarda yer alan idari ve akademik personelin kullanımında olan mekânlar, çok sayıda kişinin aynı mekânı paylaşarak çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle yeni alınacak akademik personel için yer temin etmek önemli sorunlardan biri olarak belirtilebilir. Galatasaray Üniversitesinin mevcut kullanım alanlarının birimlere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Beşiktaş İlçesi Ortaköy semtinde yer alan Galatasaray Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 24.702 m² arazi yüzölçümüne ve 28.496,81 m² kapalı alana sahiptir. Ayrıca üniversitenin Beyoğlu, Şişli ve Avcılar ilçelerinde de yerleşkeleri bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplam arazi yüzölçümü 208.635 m², kullanımda olan toplam kapalı alanı 84.797,76 m²’dir.

ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MYO, VE TÜM BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR m ²									
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar			Spor Alanları			Toplam Kapalı Alan
	İdari Binalar	Derslik	Araştırma ve Laboratuvar	Kantin Kafe vs	Lojman	Yatakhane	Sirkülasyon alanı	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
Ortaköy Yerleşkesi	15.144,43	3.117,74	2.478,51	843	175,14	-	5.903,99	-	834	28.496,81
Beyoğlu Yerleşkesi	8.667,78	5.020,81	643,05	132,15	1.019,16	1.893,78	4.981,83	4.865	577,39	27.800,95
Şişli Yerleşkesi	1.141,53	519	-	13,26	-	-	326,21	-	-	2.000
İlköğretim Okulu Avcılar Yerleşkesi	1.750	4.900	800	1.650	-	-	11.550	-	5.850	26.500
TOPLAM	26.703,74	13.557,55	3.921,56	2.638,41	1.194,30	1.893,78	22.762,03	4.865	7.261,39	84.797,76

İnşaatına 2006 yılı sonlarında başlanan Galatasaray İlköğretim Okulu Bahçeşehir Kampüsü, 5.850 m²lik kapalı spor tesisleri ve 26.500 m²lik ilköğretim okulundan oluşacaktır. İlk etabı 2009 yılında tamamlanmıştır. 2010 yılında hizmet binasının yapımına başlanmış olup inşaat halen devam etmektedir.

Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi Beyoğlu kampüsünde, yukarıdaki tabloda belirtilen fiziki alanlar içerisinde; 1887 m²lik “Galatasaray Müzesi” bulunmaktadır.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

6 Haziran 1994 tarihli ve 21952 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 2809 sayılı Kanunla eklenen geçici 29. Maddede, “Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesine devredilmiş sayılır” denilmektedir. Bu nedenle tüm bakım ve onarım işlemleri ile yeni işlemlere ait yatırımlar Üniversite bütçesinden harcanmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde 25 adet lojman bulunmaktadır. Yine Kurumumuz envanterinde 4 adet binek otomobil, 2 adet minibüs (Bağış yolu ile edinme), ile birlikte mevcut taşıt sayısı 6 adettir. Hizmet alımı suretiyle kullanılan 3 adet binek otomobil olmak üzere toplam 9 adet taşıt bulunmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi 2022 Yıl Sonu Mevcut Taşıt Listesi

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
1	BİNEK	34 GSU 98	2008	RENAULT	1			
2	BİNEK	34 GS 0954	2008	RENAULT	1			
3	BİNEK	34 GS 0292	2015	FİAT	1			
4	MİNİBÜS	34 TA 5385	2015	FORD				1
5	MİNİBÜS	34 GD 0614	2015	KARSAN				1
6	BİNEK	34 BU 1671	2017	RENAULT	1			
TOPLAM					4			2

Üniversitemizde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının Program Bütçe Sistemi kullanılmaktadır. Ödemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün MYS sistemi ile KBS sistemi kullanılarak Kurumumuz personeli maaş ödemeleri ve diğer ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca yatırım projeleri ve harcamaları da elektronik ortamda Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) üzerinden takip edilmektedir.

8. 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yerleşkelerinde yapılan çalışmalar projelendirme, bakım, onarım ve restorasyon niteliğinde olup, mekanlarımızın ilgili mevzuat çerçevesinde iyileştirilmesi yapılmaktadır.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi; Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi 65 pafta, 575 ada, 37 parselde yer alan Galatasaray Üniversitesi Tevfik Efendi Sahil Sarayı ile ilgili olarak İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile restorasyon uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

Ortaköy Yerleşkesi Rektörlük, Yabancı Diller ve Sosyal Bilimler Binaları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Mühendislik, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği projeleri hazırlanarak İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuştur.

Hedeflenen;

- Yatırım Programlarının hazırlanmasını,
- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilave ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni binaların yapılmasını,
- Mevcut binaların tadilat ve büyük onarımlarının yapılmasını,
- Statik açıdan gerekli binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılmasını,
- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su elektrik enerjisi temel altyapısı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatlarının yenilenmesini,
- Yerleşke içerisindeki çevre düzenlenmesini,
- Yapım tadilat ve büyük onarım ile altyapısı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerine birebir izler ve denetler, geçici ve kesin kabullerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir,

Gerçekleşen;

2022 yılında aşağıda belirtilen işler tamamlanmıştır.

- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirilmesi 1. Etap İşi
- GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkeleri Muhtelif Onarım ve Çevre Düzenleme İşleri
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Ağ Altyapısı Güçlendirilmesi ve Sistem Odalarının Yeniden Yapılandırılması İçin Gerekli Ürünlerin Temini İşi
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Restorasyon ve Mütferrik işleri
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Binasında Yeni Çalışma Mekanlarının Yapılması ve Toprak Altı Anı Hattının Acil Onarım İşi
- GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkesi Muhtelif Mekanik Tesisatlarının Onarım İşi
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Muhtelif Mekanların Aydınlatmasının Yapılması İşi
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Yapısı UPS Akülerinin Değişimi ve Kablosuz Ağ Bağlantı Sisteminin Kurulumu İşi
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Laboratuvarlar, Depo ve Amfilerin Havalandırma ve Soğutma Tesisatlarının Yapılması İşi
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Yatakhanelerinin Arızalı Olan Tesisatlarının Onarımı İşi

9. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

15 Ocak 2022 Tarihli ve 31720 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2022 Yatırım Programı ile Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 6 adet ve Eğitim-Kültür Sektöründe 1 adet olmak üzere toplamda 7 adet yatırım projemiz mevcuttur.

Etüt Proje	1 adet	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Devam Eden Projeler	3 adet	Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Altyapısı Projesi Feriye Sarayı Müştemilatı Onarımı
Yeni Projeler	3 Adet	Yayın Alımı Muhtelif İşler Büyük Onarım (Güçlendirme)

- 1- 2022H03-186544 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkelerinin rölöve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik ve mimarlık projelerinin yapılması)
- 2- 1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin ve inşaat işlerini projelerinin yapılması)
- 3- 2020H03-150316 Kampüs Altyapısı Projesi (Üniversite Yerleşkesinin bilgisayar ağı altyapısı, kanal, elektrik, su, çevre düzenleme, doğalgaz, yol, ısı merk. Art. Trafo, telefon ve çevre güvenlik işleri)
- 4- 2022H03-186537 Muhtelif İşler Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin büyük onarım işleri- bilgisayar, makine ve teçhizat alımları ve bilgisayar yazılım alımları)
- 5- 2022H03-186541 Yayın Alımı (sürelili ve süresiz yayınlar ve elektronik kitap yayın alımları)
- 6- 2020H04-135949 Feriye Sarayı Müştemilatı Onarımı
- 7- 2022H03-186750 Büyük Onarım Güçlendirme (Onarım, Güçlendirme, Restorasyon)

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Üniversitemiz Ortaköy ve Beyoğlu (Galatasaray Lisesi-Galatasaray Ortaokulu) Yerleşkelerinde bulunan binalar tarihi eser niteliğinde olup, restorasyon çalışmaları için gerekli izin ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan gecikmeler yaşanmaktadır. Bu da yıllık hedeflerimizin özellikle Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ve Kampüs Altyapısı Projesi işlemlerinin bir sonraki yıllara sarkmasına yol açmaktadır.

10. 2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER

2022 yılında Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin (06 Sermaye Giderleri) toplam ödeneği 31.452.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 550.000 ,00 TL Likit Karşılığı ve 11.144.545,00 TL Yedek Ödenek (Yatırımı Hızlandırma Ödeneği) eklenmek suretiyle genel toplamda 43.146.545,00 TL ödeneye ulaşmış olup, bu ödeneğin 41.861.908,00 TL'lik kısmı harcanmıştır.

2022H03-156544 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Proje Tutarı 200.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 200.000,00 TL olup yıl içerisinde Proje kapsamında 179.690,40 TL harcama gerçekleşmiştir.

1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: Proje Tutarı 4.700.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.000,00 TL olup Proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

2020H03-150316 Kampüs Altyapısı: Proje Tutarı 6.000.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.500.000,00 TL olup yıl içerisinde 2.498.650,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

2022H03-186537 Muhtelif İşler: Proje Tutarı 6.350.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 6.350.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 5.668.659,43 TL harcama gerçekleşmiştir.

2020H04-135949 Feriye Sarayları Müştemilatı Onarımı: Proje Tutarı 16.000.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 6.000.000,00 TL olup yıl içerisinde proje kapsamında 11.144.545,00 TL Yedek Ödenek (Yatırımı Hızlandırma Ödeneği) eklenmek suretiyle ödenek eklenmiştir.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


Genel Toplamda proje ödeneđi 17.144.545,00 TL'ye ulařmıř olup proje kapsamında yıl içerisinde 16.691.556,81 TL harcama gerekleřmiřtir.

2022H03-186541 Yayın Alımı: Proje Tutarı 1.500.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Bařlangı Ödeneđi 1.500.000,00 TL olup yıl içerisinde 550.000,00 TL likit karřılıđı ödenek eklenmiřtir.

Genel Toplamda proje ödeneđi 2.050.000,00 TL'ye ulařmıř olup, proje kapsamında yıl içerisinde 2.044.426,47 TL harcama gerekleřmiřtir.

2022H03-186750 Büyük Onarım: Proje Tutarı 25.000.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Bařlangı Ödeneđi 14.900.000,00 TL olup yıl içerisinde 14.778.924,80 TL harcama gerekleřmiřtir.

2022 Yılı Kamu Yatırımları Proje Bazında Harcama Raporu

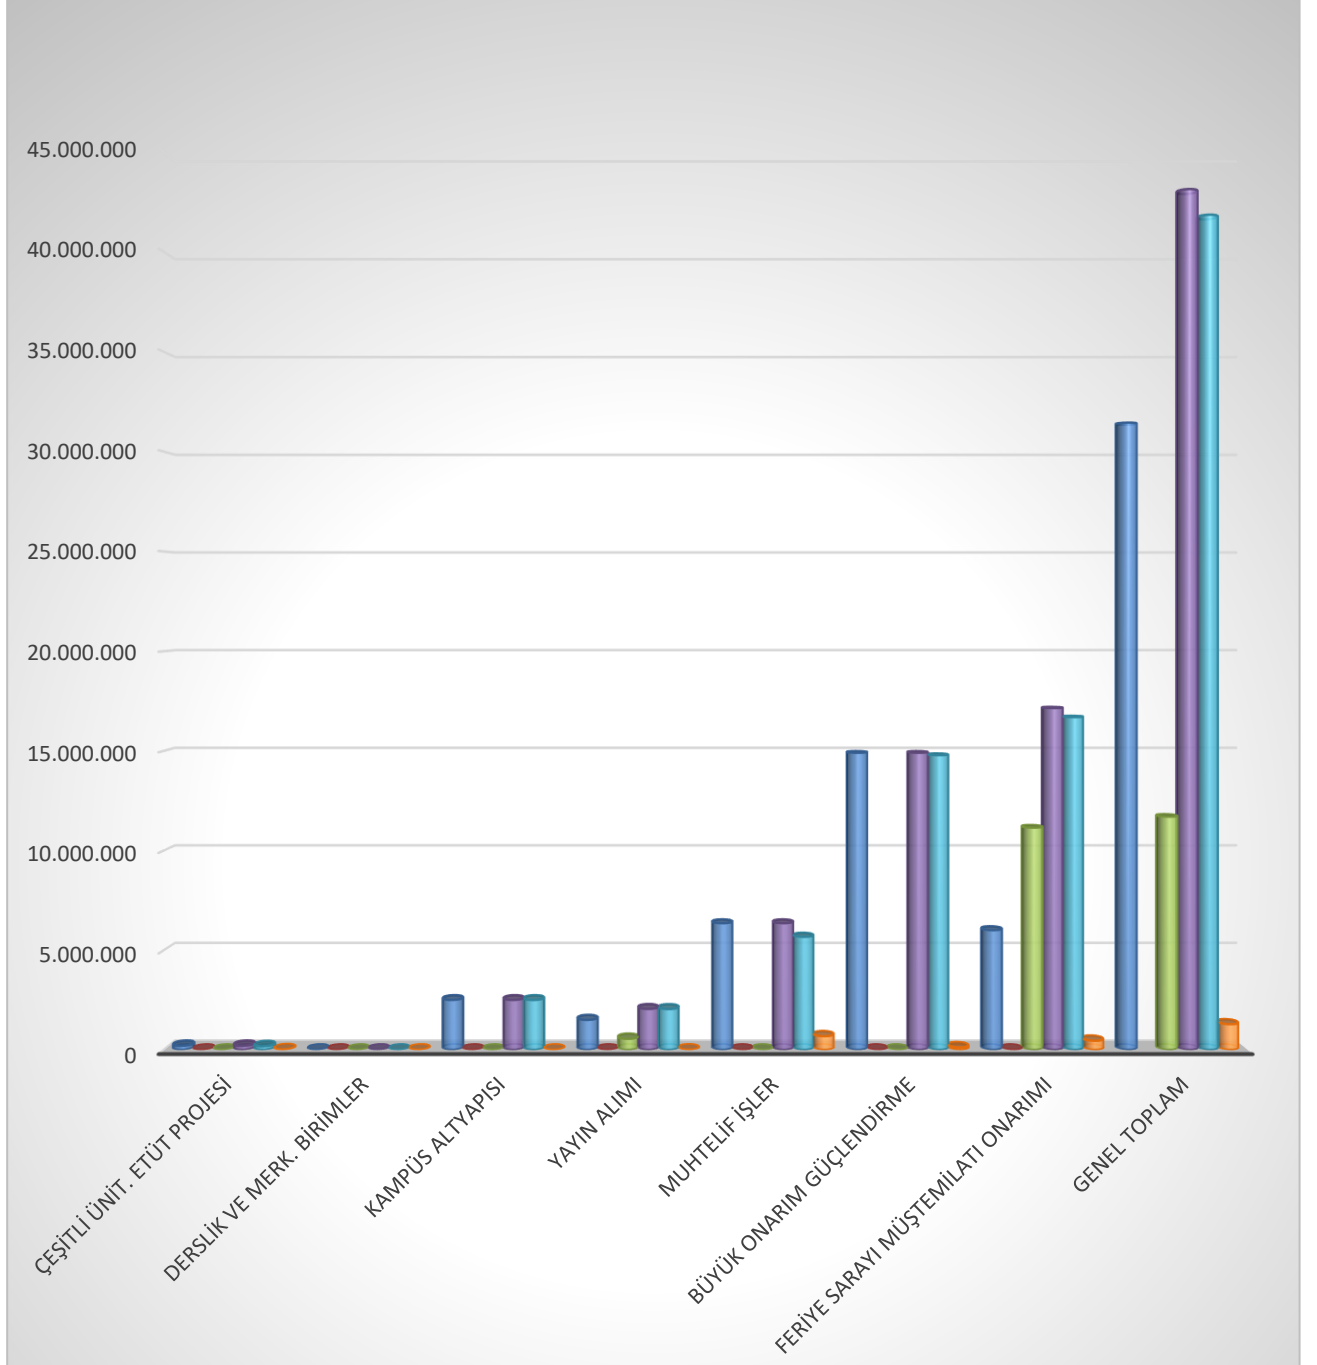

	Çeşitli Ünit. Etüt Projesi	Derslik ve Merk. Birimler	Kampüs Altyapısı	Yayın Alımı	Muhtelif İşler	Büyük Onarım Güçlendirme	Feriye Sarayı Müştemilatı Onarımı	Genel Toplam
■ Başlangıç Ödeneği	200.000	2.000	2.500.000	1.500.000	6.350.000	14.900.000	6.000.000	31.452.000
■ Düşülen	0	0	0	0	0	0	0	
■ Eklenen	0	0	0	550.000	0	0	11.144.545	11.694.545
■ Toplam Ödenek	200.000	2.000	2.500.000	2.050.000	6.350.000	14.900.000	17.144.545	43.146.545
■ Harcama	179.690	0	2.498.650	2.044.426	5.668.660	14.778.925	16.691.557	41.861.908
■ Kalan Ödenek	20.310	2.000	1.350	5.574	681.340	121.075	452.988	1.284.637

11. 2022 YILI PPROJE GİDERLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR

- **2022H03-186544 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:** Proje Tutarı 200.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 200.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 179.690,40 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2022 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2022 YILI YATIRIMLARINDA			
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUM	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)	
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR		
2022-2022	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Sıfır Atık Belgelemesi İçin Geçici Depolama Alanları ve Çevre Düzenleme Projesinin Yapımı İşİ					% 100	% 100	179.690,40
TOPLAM			0	0	0	0	0	179.690,40

- **1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:** Proje Tutarı 4.700.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleştirilmemiştir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2022 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2022 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
1996 -2023	Derslik ve Merkezi Birimler (Yönetim Binası)		0	0	0	0	0,00
TOPLAM			0	0	0	0	0,00

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- **2020H03-150316 Kampüs Altyapısı:** Proje Tutarı 8.906.437,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.500.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 2.498.650,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2022 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2022 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
2020-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Ağ Altyapısı Güçlendirilmesi ve Sistem Odalarının Yeniden Yapılandırılması İçin Gerekli Ürünlerin Temini İşİ				% 100	% 100	2.478.000,00
2020-2023	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Yatakhanelerinin Arızalı Olan Isıtma Tesisatlarının Onarımı İşİ				% 100	% 100	20.650,00
		TOPLAM					2.498.650,00

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- **2022H03-186537 Muhtelif İşler:** Proje Tutarı 6.350.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 6.350.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 5.668.659,43 TL harcama gerçekleşmiştir.

1) 2022H03-186537 Muhtelif İşler (Büyük Onarım- Hizmet Binası)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2022 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2022 YILI YATIRIMLARINDA			
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)	
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR		
2022-2022	GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkeleri Muhtelif Onarım ve Çevre Düzenleme İşleri					% 100	% 100	1.702.348,87
2022-2022	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Binasında Yeni Çalışma Mekanlarının Yapılması ve Toprak Altı Ana Hattının Acil Onarım İşleri					% 100	% 100	387.984,00
2022-2022	GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkeleri Muhtelif Mekanik Tesisatlarının Onarımı İşleri					% 100	% 100	233.935,00
2022-2022	GSÜ Tarihi Yerleşkeleri Elektrik ve Makine Tesisatlarının Onarımı İşleri					% 100	% 100	542.800,00
		TOPLAM						2.867.067,87

2) 2022H03-186537 Muhtelif İşler (Bilgisayar Donanım ve Sistem Alımı)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2022 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
18.04.2022	Üniversitemiz ve bağlı birimlere sunulacak hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi amacıyla kullanılacak bilişim malzemelerinin alımı.	% 100	% 100	41.010,67
07.07.2022	Masaüstü bilgisayar alımı.	% 100	% 100	194.267,32
30.11.2022	Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar ve monitör alımı.	% 100	% 100	303.148,25
21.12.2022	Üniversitemiz Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Ergonomi Laboratuvar malzemelerinin alımı.	% 100	% 100	22.004,64
26.12.2022	Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere, masaüstü bilgisayar, monitör ve dizüstü bilgisayar alımı.	% 100	% 100	157.634,78
	TOPLAM			718.065,09

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3) 2020H03-186537 Muhtelif İşler (Makine Teçhizat Alımları)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2022 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
10.02.2022	Üniversitemiz ve Bağlı yerleşkelerinde bulunan konutların iyileştirme çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve ofis mobilyalarının alımı	% 100	% 100	23.217,60
9.05.2022	Üniversitemiz kampüsünde kullanılmak üzere elektrik ve aydınlatma malzemelerinin alımı.	% 100	% 100	46.545,11
10.05.2022	Üniversitemiz Fakültelerinin çalışma ofislerine büro mefruşatı ürünlerinin yaptırılması.	% 100	% 100	20.550,00
7.07.2022	Üniversitemiz Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi büro mefruşatı malzemelerinin alımı.	% 100	% 100	47.589,68
11.11.2022	Üniversitemiz ofislerinde kullanılmak üzere büro mefruşatı malzemelerinin alımı.	% 100	% 100	34.329,55
16.11.2022	Üniversitemiz dersliklerinde kullanılmak üzere ayaklı, tekerlekli ve çift taraflı 4 adet yazı tahtası alımı	% 100	% 100	6.136,00
24.11.2022	Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları ve Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Laboratuvarlarına şifreli, kartlı kapı kilit sistemi yaptırılması.	% 100	% 100	4.684,60
30.11.2022	Üniversitemiz Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ve Uzaktan Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi ofislerinde kullanılmak üzere kapaklı dolap alımı	% 100	% 100	6.750,00
27.07.2022	Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılmak üzere led tv alımı.	% 100	% 100	4.530,02
27.09.2022	Üniversitemiz Ortaköy Yerleşkesinde bulunan lavabolara el kurutma makinesi ve vantilatör alımı.	% 100	% 100	49.937,60
18.10.2022	Üniversitemiz Ortaköy Yerleşkesi dersliklerinde ve toplantı salonlarında bulunan koltuk, sıra ve sandalyelerinin bakım, onarım ve yedek parça alımı.	% 100	% 100	65.687,72
3.11.2022	Üniversitemiz Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinin fizik, kimya laboratuvarlarında kullanılmak üzere laboratuvar malzemesi alımı.	% 100	% 100	46.315,00
24.11.2022	Üniversitemiz Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgi İletişim Laboratuvarlarında kullanılmak üzere şifreli kartlı kapı Kilit sistemi yaptırılması.	% 100	% 100	11.121,50
8.12.2022	Üniversitemiz Ortaköy Yerleşkesi dersliklerinde bulunan projeksiyon cihazlarının yedek parçalarının alımı.	% 100	% 100	85.238,48
9.12.2022	Üniversitemize bağlı Galatasaray Lisesi çamaşırhanesinde kullanılmakta olan sanayi tipi çamaşır makinesine yedek parça alımı.	% 100	% 100	15.576,00
21.12.2022	Üniversitemiz bağlı birimlerinde kullanılmak üzere büro mobilyaları alımı.	% 100	% 100	120.618,29
21.12.2022	Üniversitemizin Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Ergonomi Laboratuvar Malzemeleri alımı.	% 100	% 100	24.812,46
26.12.2022	Üniversitemiz Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Ortak Araştırma Laboratuvarı büro mefruşat alımı.	% 100	% 100	36.098,80
TOPLAM				649.738,41

4) 2022H03-186537 Muhtelif İşler (Engelli Erişiminin Sağlanması)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2022 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
31.03.2022	Portatif Engelli rampa alımı.	% 100	% 100	2.325,00
10.05.2022	Üniversitemiz Engelsiz Üniversite kapsamında binalarımızın erişilebilirlik ve yönlendirme tabelaları ile hissedilebilir ayaklı kat planı yaptırılması	% 100	% 100	72.670,30
TOPLAM				74.995,30

5) 2022H03-186537 Muhtelif İşler (Bilgisayar Yazılım Alımları)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2022 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
31.03.2022	Uzaktan Eğitim Yazılım alımı.	% 100	% 100	23.895,00
10.05.2022	Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları 2022 yılı lisans yenileme.	% 100	% 100	472.745,76
08.06.2022	Üniversitemizde mevcut Proje Süreçleri Yönetim Sistemi BAPSİS kapsamında kullanılmak üzere geliştirilen Araştırmacı Performans Değerlendirme Yazılım Modülü ve YÖKSİS Veri Aktarım Modülü alımı.	% 100	% 100	150.000,00
07.07.2022	Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kullanmakta olduğu masaüstü ve dizüstü bilgisayarların virüs saldırılarından korunabilmesi için anti virüs program alımı.	% 100	% 100	93.456,00
16.08.2022	MATLAB Yazılım alımı.	% 100	% 100	133.600,87
18.10.2022	Üniversitemiz İletişim Fakültesinin laboratuvarlarında kullanılan Adobe yazılım lisansı alımı.	% 100	% 100	160.215,68
30.11.2022	Üniversitemizde mevcut Akademik Veri Yönetim Sistemi Yazılımı kapsamında geliştirilen AVESİS Bilimsel Dergi Veri tabanı Modülü ve Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi modülü alımı.	% 100	% 100	192.000,00
26.12.2022	Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Akademik Programı kapsamında laboratuvar derslerinde kullanılmak üzere GAMS yazılım programı alımı.	% 100	% 100	97.479,45
26.12.2022	Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı biriminde kullanılmak üzere PaperCut Yazılım sistemi alımı.	% 100	% 100	35.400,00
TOPLAM				1.358.792,76

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- **2022H03-186750 Büyük Onarım (Güçlendirme):** Proje Tutarı 25.000.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 14.900.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 14.778.924,80 TL harcama gerçekleşmiştir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2022 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2022 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
2022-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirmesi 1.Etap				% 100	% 100	14.778.924,80
		TOPLAM					14.778.924,80

- **2020H04-135949 Feriye Sarayları Müştemilatı Onarımı:** Proje Tutarı 16.000.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 6.000.000,00 TL olup yıl içerisinde proje kapsamında 11.144.545,00 TL Yedek Ödenek (Yatırımı Hızlandırma Ödeneği) eklenmek suretiyle ödenek eklenmiştir.

Genel Toplamda proje ödeneği 17.144.545,00 TL'ye ulaşmış olup proje kapsamında yıl içerisinde 16.691.556,81 TL harcama gerçekleşmiştir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2021 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2022 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
2020-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Restorasyonu ve Müteferrik İşleri. (İş programına göre devam etmektedir.)				% 100	% 100	15.102.828,57
2020-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Muhtelif Mekanların Aydınlatmasının Yapılması İşİ				% 100	% 100	495.836,00
2020-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Yapısı UPS Akülerinin Değişimi ve Kablosuz Ağ Bağlantı Sisteminin Kurulumu İşİ				% 100	% 100	319.992,24
2020-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Laboratuvarlar, Depo ve Amfilerin Havalandırma ve Soğutma Tesisatlarının yapımı				% 100	% 100	772.900,19
		TOPLAM					16.691.556,81

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- **2022H03-186541 Yayın Alımı:** Proje Tutarı 1.500.000,00 TL'dir. 2022 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 1.500.000,00 TL. olup yıl içerisinde proje kapsamında 550.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.

Genel toplamda proje ödeneği 2.050.000,00 TL'ye ulaşmış olup proje kapsamında yıl içerisinde 2.044.426,47 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2022 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
09.04.2021	Harmatheque	% 100	% 100	74.035,72
04.04.2022	EconLit (Ebsco)-2021/3 (Kısmi)	% 100	% 100	51.768,26
12.04.2022	Swisslex	% 100	% 100	73.275,54
21.04.2022	MathSciNet (American Mathematical Society	% 100	% 100	58.578,84
13.05.2022	Sobiad	% 100	% 100	11.744,53
18.05.2022	Legal Online	% 100	% 100	15.422,60
30.05.2022	Cambridge University Press Journals Online (Ebsco)	% 100	% 100	105.657,05
07.07.2022	Ebook Central Ebrary (Proquest LLC)	% 100	% 100	216.209,16
18.08.2022	LexisNexis	% 100	% 100	176.852,51
01.09.2022	Turcademy	% 100	% 100	33.594,93
02.09.2022	Kazancı	% 100	% 100	30.422,15
03.09.2022	Cumhuriyet Gazetesi Arşivi	% 100	% 100	1.850,00
08.09.2022	Heinonline (Ebsco)	% 100	% 100	121.640,66
06.10.2022	ACM Digital Library Online (Ebsco)	% 100	% 100	162.255,52
17.11.2022	EDS- (Ebsco)	% 100	% 100	211.382,91
17.11.2022	Rosetta Stone-(Ebsco)	% 100	% 100	206.806,03
17.11.2022	EconLit (Ebsco)	% 100	% 100	211.388,87
08.12.2022	ABI Inform Collection (Proquest LLC)	% 100	% 100	275.641,72
19.12.2022	Kanunum	% 100	% 100	5.900,00
TOPLAM				2.044.426,47

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2022 YILINDA YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN EKONOMİK GERÇEKLEŞMESİNİ GÖSTEREN CETVEL								
Proje No	Alt Projenin Adı	Bütçe Ödeneği	Düşülen Ödenek	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme Oranı
2022H03-186544	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	179.690,40	20.310,00	90
1996H03-5110000	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0
2020H03-150316	Kampüs Altyapısı Projesi	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.498.650,00	1.350,00	100
2022H03-186541	Yayın Alımı	1.500.000,00	0,00	550.000,00	2.050.000,00	2.044.426,47	5.574,00	100
2022H03-186537	Muhtelif İşler							
	Büro ve İşyeri Mak. Teçhizat Alımları	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	649.738,41	261,59	100
	Bilgisayar Donanım ve Sistem Alımları	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	718.065,09	6.934,34	99
	Bilgisayar Yazılım Alımı	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.358.792,76	591.207,24	70
	Büyük Onarım	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	2.867.067,87	7.932,13	100
	Engellilerin Erişimiminin Sağlanması	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	74.995,30	75.004,70	50
2022H03-186750	Büyük Onarım Güçlendirme	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	14.778.924,80	121.075,00	99
2020H03-135949	Feriye Sarayı Müstemilatı Onarımı	6.000.000,00	0,00	11.144.545,00	17.144.545,00	16.691.556,81	452.988,00	97
	YATIRIMLAR TOPLAMI	31.452.000,00	0,00	11.694.545,00	43.146.545,00	41.861.907,91	1.284.637,09	97

2022 YILI YATIRIMLARI REVİZE CETVELİ

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKTÖRÜ : YÜKSEKÖĞRETİM
PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI PROGRAMI						AKTARMA		YEDEK-LİKİT	2022 YILI REVİZE PROGRAMI		
PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI YATIRIMI	DÜŞÜLEN	EKLENEN	EKLENEN	BİTİŞ YILI	TOPLAM YATIRIM TUTARI	2022 YILI TOPLAM YATIRIM GERÇEKLEŞME
2022H03-186544	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2022-2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2022	200.000,00	179.690,40
1996H03-511	Derslik ve Merkezi Birimler	1996-2023	4.700.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1996-2023	2.000,00	0,00
2020H03-150316	Kampüs Altyapısı	2020-2023	8.906.437,00	5.156.437,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2020-2023	2.500.000,00	2.498.650,00
2022H03-186541	Yayın Alımı	2022-2022	1.500.000	0,00	1.500.000	0,00	0,00	550.000,00	2022-2022	2.050.000,00	2.044.426,47
2022H03-186537	Muhtelif İşler	2022-2022	6.350.000,00	0,00	6.350.000	0,00	0,00	0,00	2022-2022	6.350.000,00	5.668.659,43
2022H03-186750	Büyük Onarım Güçlendirme	2022-2023	25.000.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	14.900.000,00	14.778.924,80
2020H04-135949	Feriye Sarayı Müştemilat Onarımı	2020-2023	16.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.144.545,00	2020-2023	17.144.545,00	16.691.556,81
TOPLAM			62.656.437,00	14.156.437,00	31.452.000,00	0,00	0,00	11.694.545,00		43.146.545,00	41.861.907,91
